



No.	工事名称										工程表名										製作年月日	2012.01.10										清水建設株式会社
	佐久総合病院佐久医療センター新築工事										工事総合工程表										修正年月日											
年	平成24年												平成25年																			
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
工期	着工	根切工事開始			地下躯体開始		上階躯体開始							上棟				足場解体開始	受電			諸検査	竣工引渡									
	作成	修正	修正	修正																												
外来・中央診療棟	(地下階有り)	準備工事	整地	2次根切	山留	マットスラブ	基礎工事	B1階躯体工事	1階躯体	2階躯体	3階躯体	R階躯体	外部仕上工事	設備・電気・内部仕上げ工事	足場解体	検査																
	(地下階無し)		根切	山留	マットスラブ	基礎工事	免震装置取付	1階躯体	2階躯体	3階躯体	R階躯体	外部仕上工事	設備・電気・内部仕上げ工事	足場解体	検査																	
病棟	管理棟	準備工事	整地	根切	基礎工事	B1階躯体	1階躯体	2階躯体	3階躯体	4階躯体	PH階躯体	外部仕上工事	設備・電気・内部仕上げ工事	足場解体	検査																	
	病棟(南・東・西)			根切	基礎工事	1階躯体	2階躯体	3階躯体	パラペット	外部仕上工事	設備・電気・内部仕上げ工事	足場解体	検査																			
特高変電棟						根切	基礎	躯体工事	内部・外部仕上工事	変電設備設置	調整																					
仮設工事													外部足場設置期間																			
外構工事	移植・伐採				電気・設備埋設配管				外構各種構造物				フェンスU字溝工事				舗装・植栽															

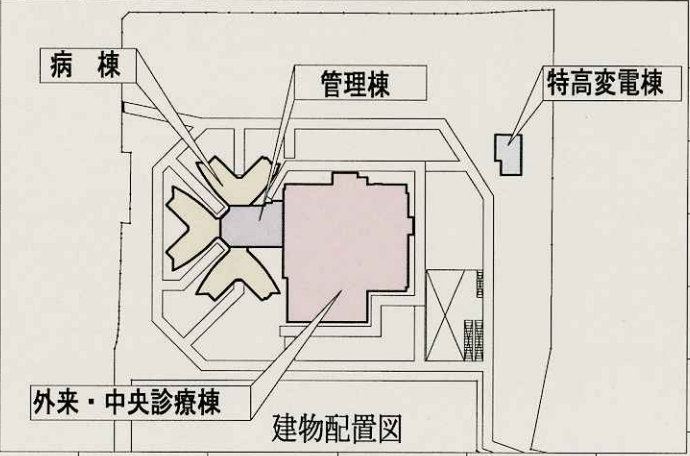

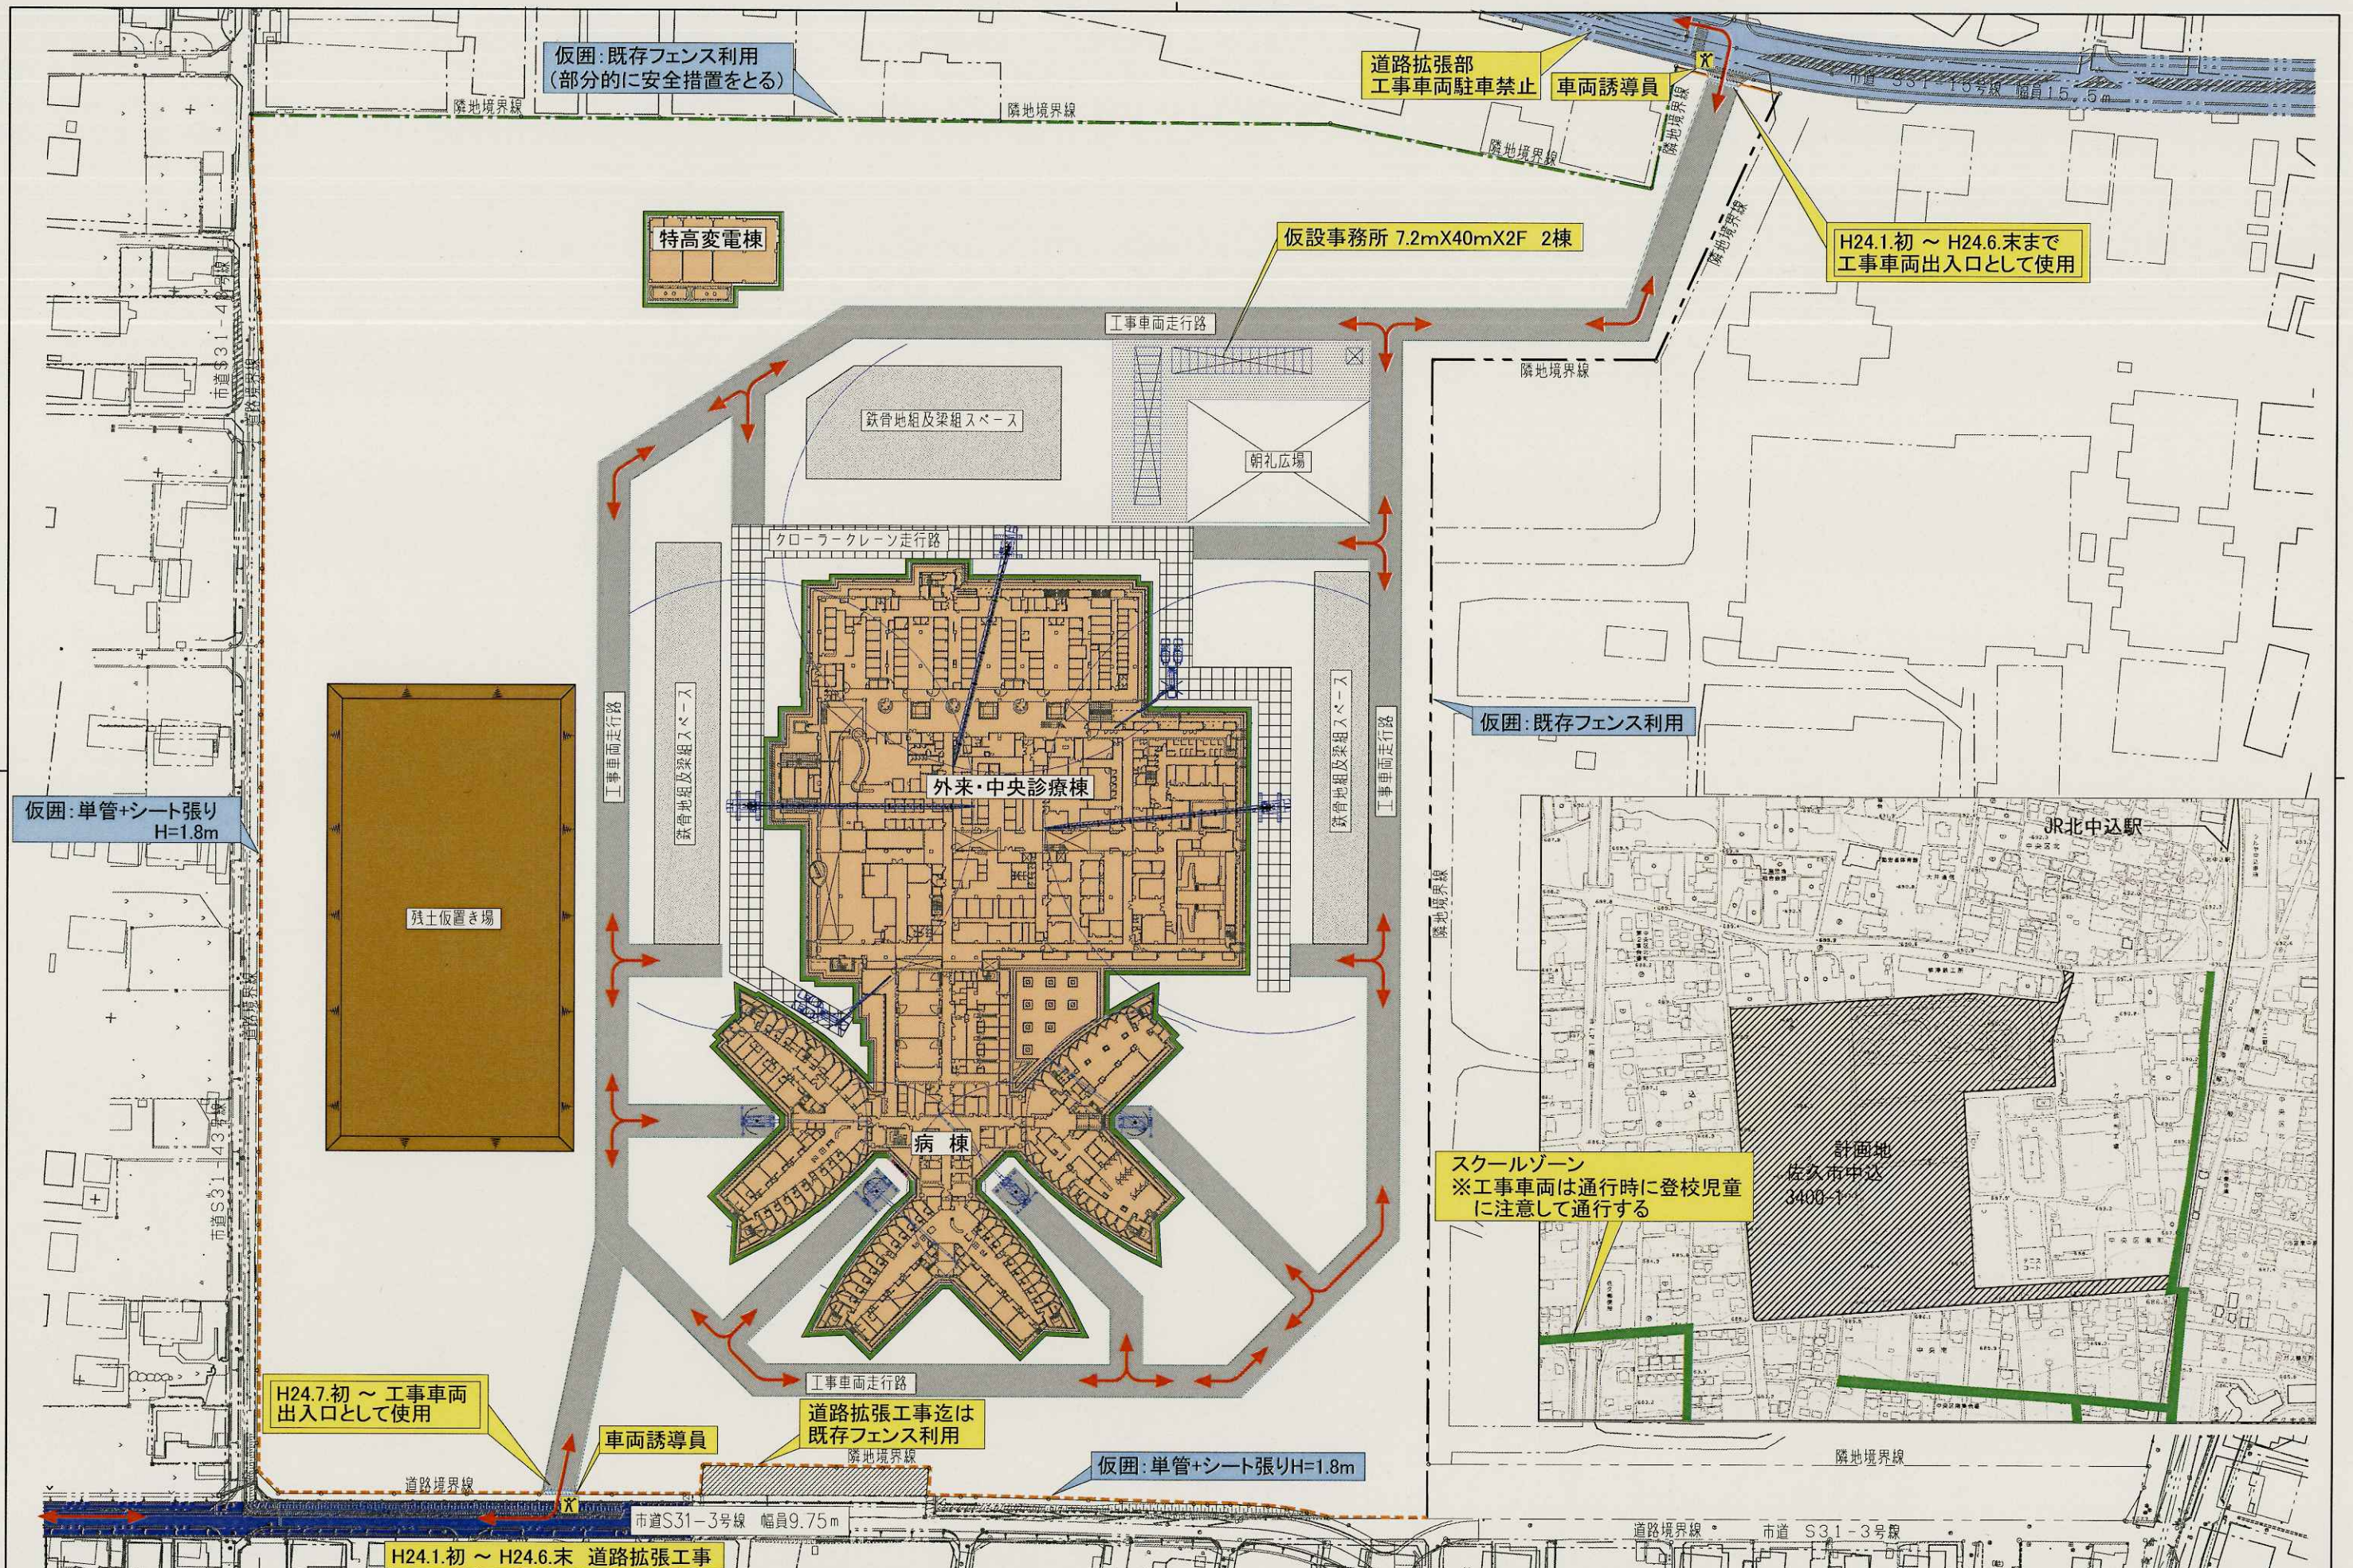

H24.1初 ~ H24.6末 道路拡張工事

記 事	変更	△ 年月 日訂正	△ 年月 日訂正	清水建設株式会社	設計	現場	生産文庫部 (課長) (印)	A3 1/1600 A1 1/800 年月日 H24.01.10	佐久総合病院 基幹医療センター新築工事
	訂正	△ 年月 日訂正	△ 年月 日訂正						
		△ 年月 日訂正	△ 年月 日訂正						
		△ 年月 日訂正	△ 年月 日訂正						
総合仮設計画図									
